


# План проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации схода на 1623 км 5 пк четного пути перегона Решеты-Ревда

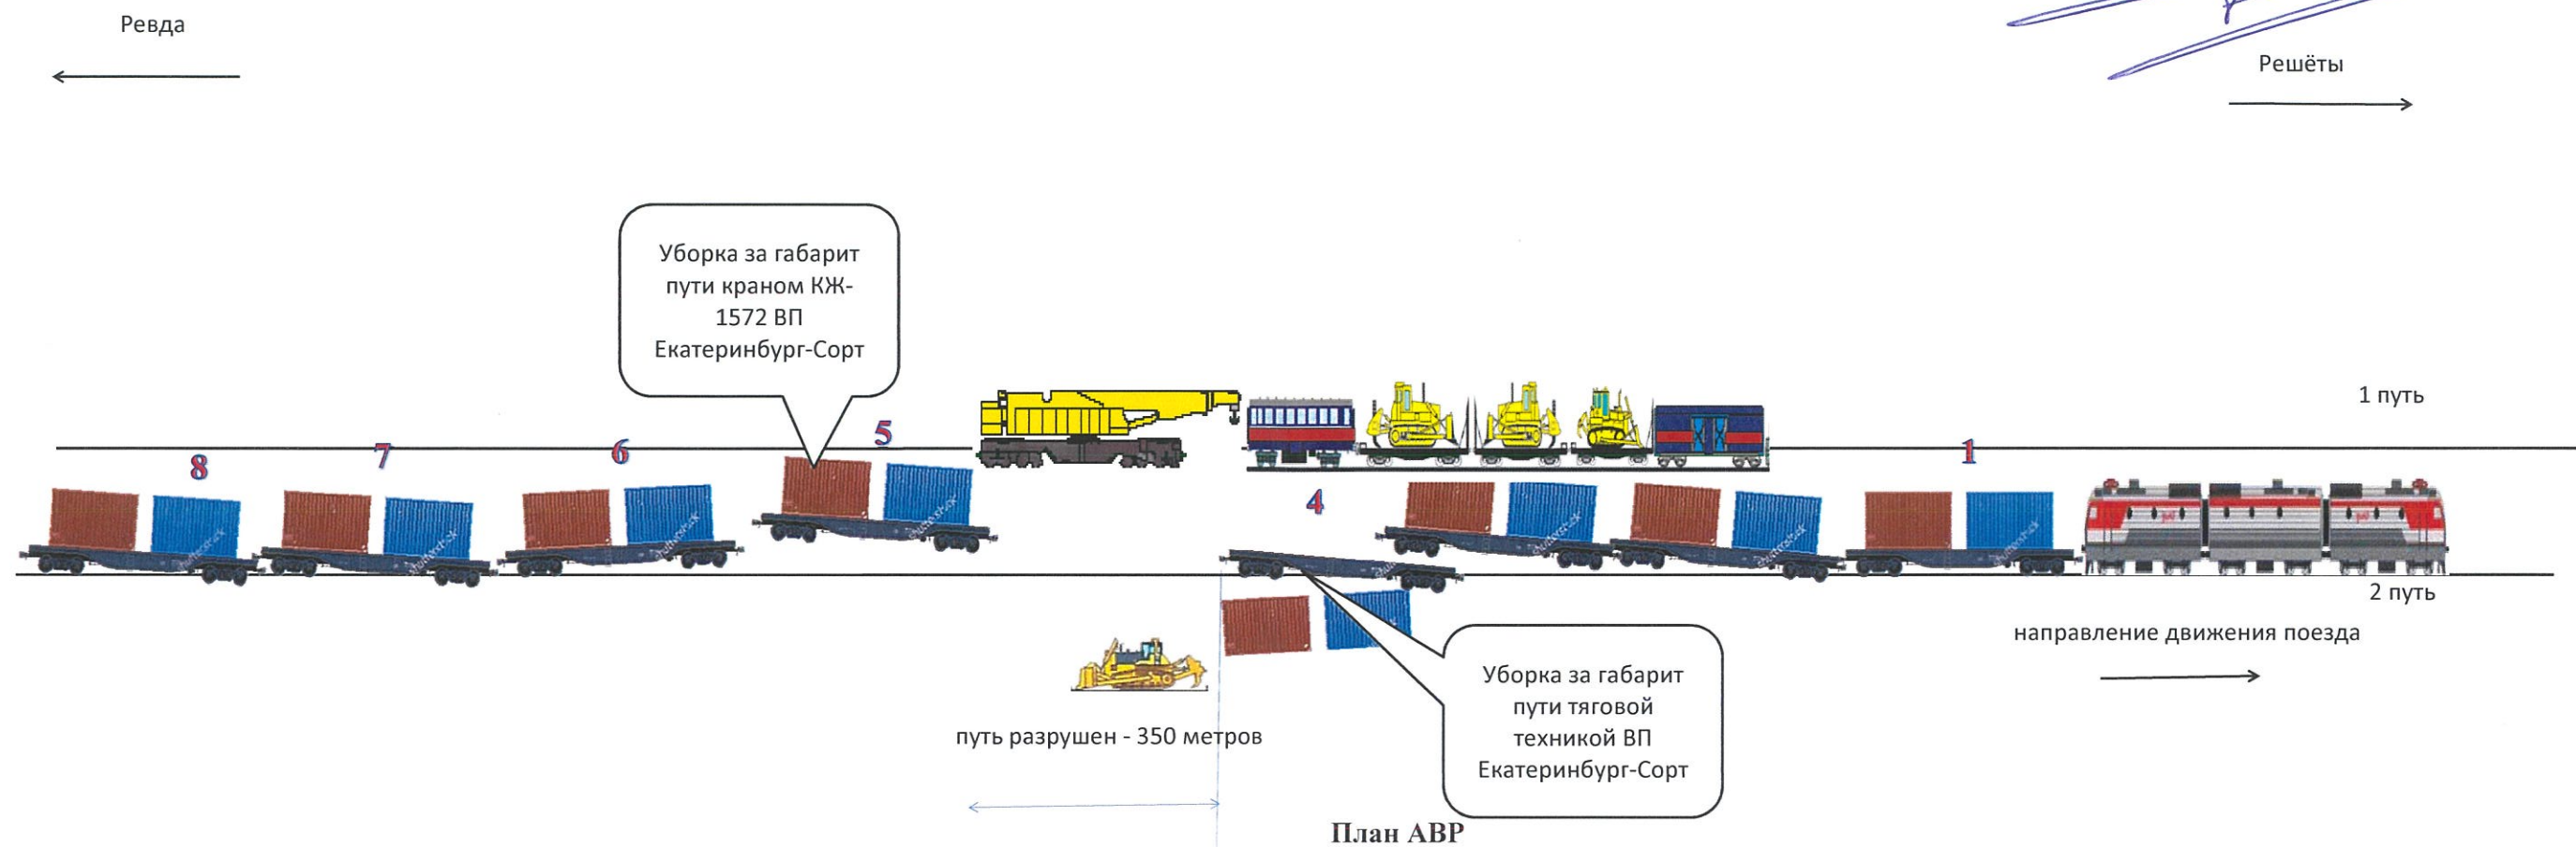

- 1 № 54910567- в сходе 2-й
- 2 № 91751081 - в сходе всеми
- 3 № 54261334- в сходе всеми КП, наклон в сторону поля 30 град
- 4 № 94649191 - в сход, наклон в сторону поля 30 град., груз развален
- 5 № 54964374 - в сходе всеми
- 6 № 91625699 - в сходе всеми
- 7 № 94947439 - в сходе всеми КП
- 8 № 98017288- в сходе всеми КП

- 1 № 54910567- в сходе 2-й
- 2 № 91751081 - в сходе всеми
- 3 № 54261334- в сходе всеми КП, наклон в
- 4 № 94649191 - в сход, наклон в сторону поля 30 град., груз
- 5 № 54964374 - в сходе всеми
- 6 № 91625699 - в сходе всеми
- 7 № 94947439 - в сходе всеми
- 8 № 98017288- в сходе всеми КП

- гидравлическое/накаточное оборудование
- гидравлическое/накаточное оборудование
- гидравлическое/накаточное оборудование
- уборка за габарит тяговой техникой
- уборка за габарит пути краном КЖ-1572 ВП
- накаточное оборудование+автокран
- накаточное оборудование+автокран
- накаточное оборудование+автокран

## план восстановительных работ

1. прибытие ВП Екат-Сорт к месту работ на нечет путь в 15-50
2. приведение в габарит 2-х фтг пл с контейнерами по нечетному пути перегона Решеты-Ревда 18-30, параллельно выгрузка бульдозеров двух единиц
3. отправление ВП Екат-Сорт с нечетного пути прегонна, открытие движения по нечетному пути прегонна Решеты-Ревда 19-00
4. подъем фтг пл на четном пути перегона Решеты-Ревда накаточным, гидравлическим оборудованием + автокран и тяговая техника 22-40
5. АВЗ (500 м РШР, грейдер, материалы для укладки 200 м пути раздельным способом) со ст Баранчинская 16-45, прибытие на ст Решеты 21-00
6. ХДВ №1 16 вагонов со ст Екат-Сорт прибытие на ст Решеты 21-30
6. ЭЛБ-053, ВПО-481 со ст Н-Тагил прибытие на ст Решеты 22-00
7. ХДВ №2 10 вагонов+классник со ст Екат-Сорт прибытие на ст Решеты 22-30
8. начало укладки РШР в 23-00. окончание восстановительных работ 06-00 01.07.2021
